

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计旬报 2015-11-10)

2015 年第 43 期

水利部规划计划司

2015 年 11 月 16 日

据统计，截至 2015 年 11 月 10 日，中央水利建设投资完成情况如下：


一、2015 年投资计划完成情况

2015 年已安排中央水利建设投资计划 2621.47 亿元，其中，中央投资 1683.32 亿元，地方配套投资 938.15 亿元。各地累计完成年度中央投资计划 1949.8 亿元，投资完成率 74.4%，较 10 月底增加 4.6 个百分点。其中完成中央投资 1295.9 亿元，投资完成率为 77.0%，较 10 月底增加 4.3 个百分点；完成地方配套投资 653.9 亿元，投资完成率为 69.7%，较 10 月底增加 5.1 个百分点。11 月上旬完成 121.9 亿元，其中，完成中央投资 72.7 亿元，完成地方配套投资 49.2 亿元。

年度中央投资计划完成率前 5 位的地区有：大连、浙江、天津、兵团和青海；后 5 位的地区是：**河北、江西、海南、广西和湖南**。其中，重大水利工程中央投资完成率前 5 位的地区有天津、海南、广东、浙江和青岛；后 5 位的地区是：**江西、重庆、湖南、**

广西和宁波。


图1 2015年年度投资计划完成率
(按地区分)

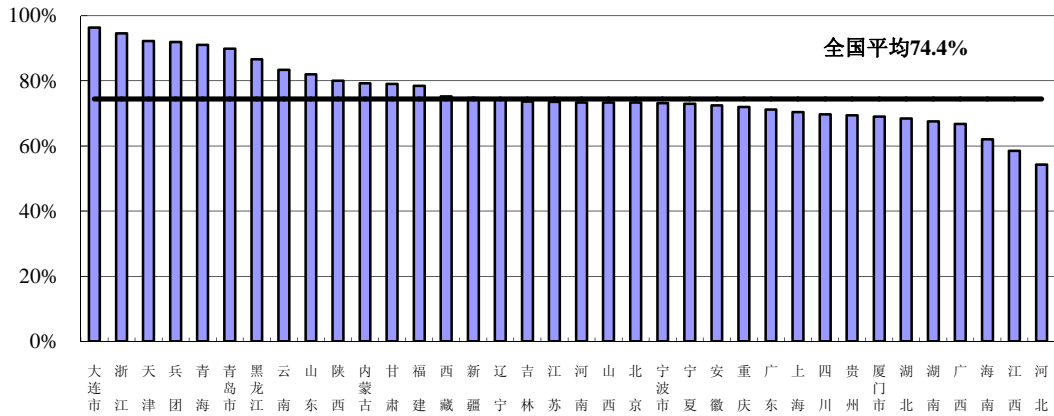

二、中央投资完成情况

截至2015年11月10日,已累计完成2015年中央投资1295.9亿元,完成率77.0%。中央投资完成率较高的地区有大连、黑龙江、浙江、山东、江苏和兵团,较低省份有:海南、河北、广西、江西和湖南。


图2 2015年中央投资计划完成率
(按地区分)

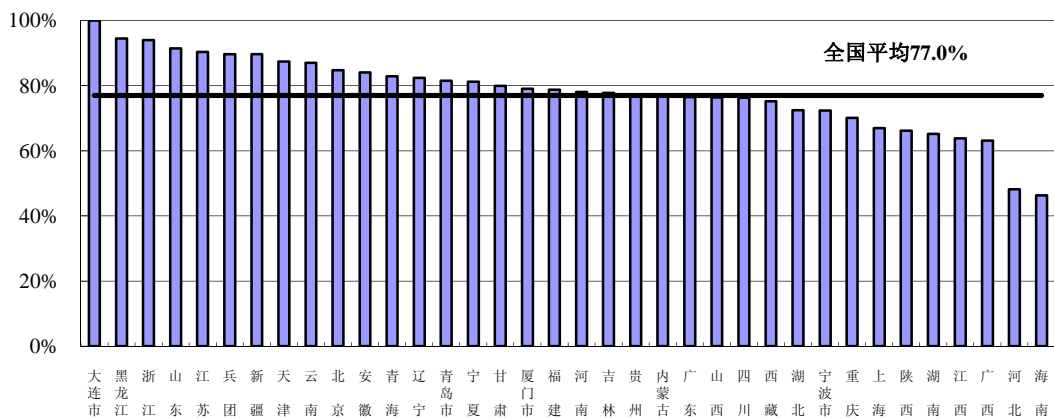

1. 中央预算内投资。已累计完成中央预算内水利投资计划1106.1亿元,完成率81.7%。其中,完成中央投资697.8亿元,


完成率 83.2%；完成地方配套投资 408.3 亿元，完成率 79.4%。从项目类别看，农村饮水安全、大中型病险水库(闸)除险加固、水土保持、中型水库、主要支流治理项目的中央投资完成率分别为 97.0%、75.8%、66.0%、90.6%和 73.7%。本旬中央投资完成率增长较快的项目类型是牧区水利、水土保持、水利血防。分地区中央预算内投资完成情况见图 3。

图3 2015年中央预算内投资完成率
(按地区分)

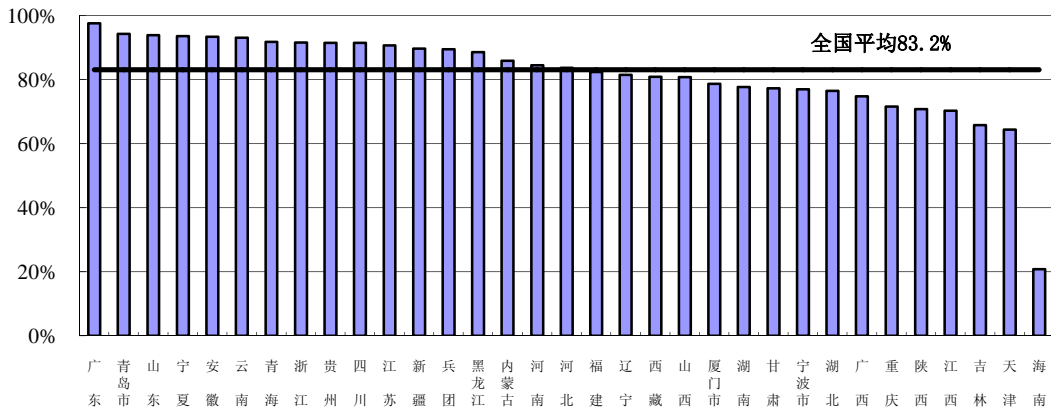

2. 中央财政专项资金。已累计完成中央财政水利专项资金预算 843.7 亿元，完成率 66.5%。其中，完成中央资金 598.1 亿元，完成率 70.8%；完成地方配套资金 245.6 亿元，完成率 58.0%。从项目类别看，江河湖库水系综合整治、农田水利建设和水土保持专项、山洪灾害防治项目的中央资金完成率分别为 73.8%、64.2%、70.4%。本旬中央投资完成率增长较快的项目类型是江河湖库连通工程、农发资金用于水土保持、农田水利建设和水土保持专项。分地区中央财政专项资金完成情况见图 4。

图4 2015年中央财政水利专项资金完成率

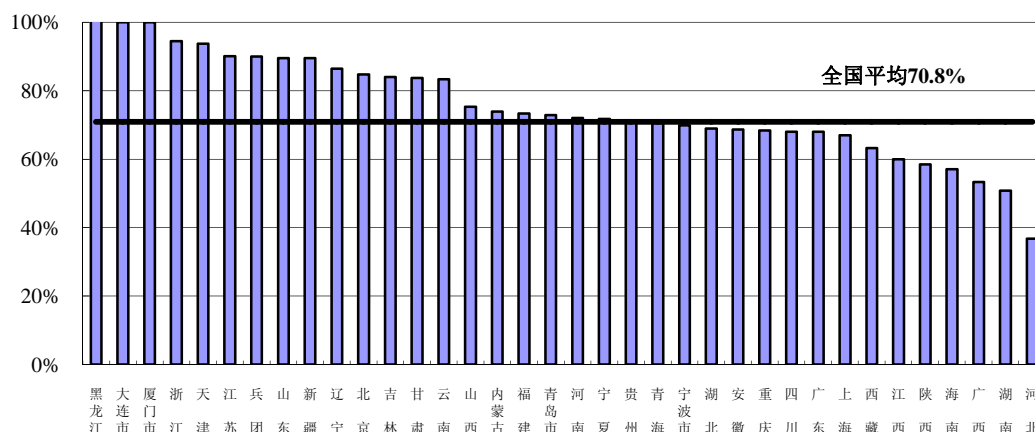

三、重大水利工程投资完成情况

截至 2015 年 11 月 10 日，重大水利工程已累计完成年度中央水利投资计划 707.8 亿元，投资完成率为 69.6%，较 10 月底增加 4.1 个百分点。其中，完成中央投资 477.4 亿元，完成率 78.3%，较 10 月底增加 4.3 个百分点；完成地方配套投资 230.4 亿元，完成率 56.6%，较 10 月底增加 4 个百分点。从工程类别看，重大农业节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资完成率分别为 75.2%、69.7%、68.5%、77.4%、89.5%和 87.2%，较 10 月底分别增加 7.5、3.5、2.1、3.6、4.6 和 3.7 个百分点。
