

# 水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2016-6)

2016 年第 25 期

水利部规划计划司

2016 年 7 月 11 日

## 一、2016 年中央水利建设投资情况

截至 2016 年 6 月 30 日，2016 年已累计安排中央水利建设投资 1374.4 亿元，其中中央预算内水利建设投资 776.9 亿元，主要安排重大水利工程 561.0 亿元，农村饮水安全 30.0 亿元，大中型病险水库（闸）除险加固 25.0 亿元，水土保持和生态建设 17.8 亿元，中型水库等 62.0 亿元，主要支流治理 55.0 亿元，大型灌排泵站更新改造 7.0 亿元，农村小水电 3.0 亿元，行业能力建设 16.1 亿元；中央财政水利专项资金 597.5 亿元，主要安排江河湖库水系综合整治 185.0 亿元、小型农田水利 364.5 亿元、水土保持 33.0 亿元和山洪灾害防治 15.0 亿元。

中央投资地方已累计分解下达 1210.4 亿元、累计拨付项目单位资金 1016.9 亿元、累计完成投资 465.3 亿元，中央投资分解下达率、资金到位率、投资完成率分别为 88.1%、74.0%和 33.9%。分项目类型、分地区中央水利建设投资及配套投资的落



**2. 中央财政专项资金。**2016 年中央财政水利专项资金预算 744.2 亿元（中央资金 597.5 亿元，地方配套资金 146.7 亿元），已分解下达 686.6 亿元，分解下达率 92.3%。其中，中央资金已分解下达 540.8 亿元，分解下达率 90.5%；地方配套资金已分解下达 145.8 亿元，分解下达率 99.4%。从项目类别看，江河湖库水系综合整治、小型农田水利、水土保持和山洪灾害防治项目中央资金分解下达率分别为 80.3%、84.6%、92.7%和 98.3%。

## **（二）资金到位情况**

2016 年中央水利建设年度投资计划已拨付项目单位 1473.0 亿元，资金到位率 69.9%。其中，中央投资到位 1016.9 亿元，到位率 74.0%；地方配套投资到位 456.1 亿元，到位率 62.3%。

**1. 中央预算内投资。**2016 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位 843.8 亿元，资金到位率 61.9%。其中中央投资到位 509.9 亿元，到位率 65.6%；地方配套投资到位 333.9 亿元，到位率 57.0%。

重大水利工程投资已到位 663.5 亿元，资金到位率 67.3%。其中，中央投资到位 390.8 亿元，到位率 69.7%；地方配套投资到位 272.7 亿元，到位率 64.1%。

**2. 中央财政专项资金。**2016 年中央财政水利专项资金预算已拨付项目单位 629.2 亿元，资金到位率 84.5%。其中，中央资金到位 507.0 亿元，到位率 84.9%；地方配套资金到位 122.2 亿元，到位率 83.3%。从项目类别看，江河湖库水系综合整治、小

型农田水利、水土保持和山洪灾害防治项目中央资金到位率分别为 75.8%、89.6%、78.5%和 94.0%。


### （三）项目开工情况

2016 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 9378 个，较上月增加 2512 个，工程开工率 74.7%，较上月增加 6.1 个百分点。其中中央预算内水利投资计划项目 978 个，累计开工 438 个，开工率 44.8%；中央财政水利专项资金预算项目 8400 个，累计开工 6566 个，开工率 78.2%。

### （四）投资完成情况

已累计完成 2016 年中央水利建设投资计划 657.2 亿元，完成率 31.2%。其中，完成中央投资 465.3 亿元，完成率 33.9%；完成地方配套投资 191.9 亿元，完成率 26.2%。当月完成中央投资计划 286.9 亿元，较上月增加 118.3 亿元，增幅 70.2%。

图2 2016年中央投资完成率  
(按地区分)

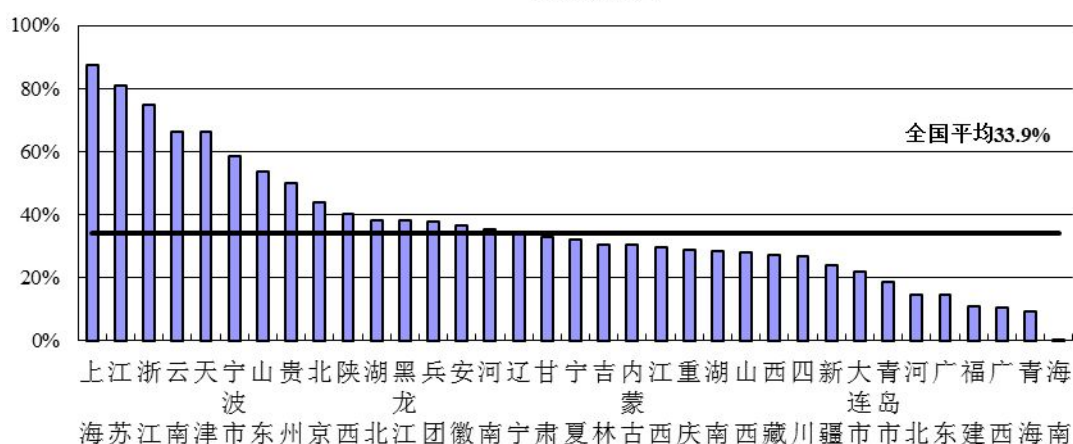

1. 中央预算内投资。已累计完成中央预算内水利投资计划 385.0 亿元，完成率 28.3%。其中，完成中央投资 243.2 亿元，

完成率 31.3%；完成地方配套投资 141.8 亿元，完成率 24.2%。

重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 325.5 亿元，投资完成率为 33.0%。其中，完成中央投资 212.7 亿元，完成率 37.9%；完成地方配套投资 112.8 亿元，完成率 26.5%。从工程类别看，大中型灌区续建配套、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建灌区工程及其他工程中央投资完成率分别为 12.7%、57.5%、33.1%、45.0%、36.9%和 31.3%。

**2. 中央财政专项资金。**已累计完成中央财政水利专项资金预算 272.3 亿元，完成率 36.6%。其中，完成中央资金 222.1 亿元，完成率 37.2%；完成地方配套资金 50.2 亿元，完成率 34.2%。从项目类别看，江河湖库水系综合整治、小型农田水利、水土保持和山洪灾害防治项目的中央资金完成率分别为 38.0%、38.3%、21.3%和 35.2%。

## 二、2015 年中央水利建设投资情况

截至 2016 年 6 月 30 日，纳入月报统计的 2015 年中央水利建设投资 1683.3 亿元，已累计下达中央水利建设投资 1669.9 亿元（不含未到位的水利建设基金 13.4 亿元），地方累计分解下达 1669.9 亿元、累计拨付项目单位资金 1671.5 亿元、累计完成投资 1658.0 亿元，中央投资分解下达率、资金到位率、投资完成率分别为 100.0%、100.0%和 99.3%。
