

# 中央水利建设投资统计 月报 (五月)

水利部规划计划司

2012年6月15日

---

2011年累计安排中央水利投资计划1140.8亿元，纳入月报统计的中央投资1093.0亿元（不含南水北调19亿元、山洪灾害防治县级非工程措施建设补助专项资金28亿元、由其他部门实施的小型农田水利建设专项资金0.8亿元），其中中央预算内投资663.1亿元，主要安排农村饮水安全工程202亿元、大中型病险水库（闸）除险加固工程25.0亿元、灌区建设与节水改造工程62.0亿元、重大水利工程374.1亿元；中央财政水利专项资金429.9亿元，主要安排中小河流治理130亿元、小型病险水库除险加固168亿元、小型农田水利建设125.2亿元、农村水电增效扩容改造6.7亿元。

截至2012年5月31日统计：

## 一、投资计划下达情况

2011年中央预算内水利投资663.1亿元，要求地方配套投资618.1亿元。已下达到项目单位中央投资计划651.8亿元、地方配套投资计划593.7亿元，投资计划下达率分别为98.3%和

96.1%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程中央投资分别下达 202.0 亿元、24.97 亿元、62.0 亿元、362.8 亿元，投资计划下达率分别为 100%、99.9%、100%和 97.0%。

2011 年中央财政水利专项资金预算共 429.9 亿元，已分解下达项目单位 403.1 亿元，预算分解下达率为 93.8%。其中中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设和农村水电增效扩容改造中央投资分别下达 112.3 亿元、162.5 亿元、123.1 亿元和 5.3 亿元，预算分解下达率分别为 86.4%、96.7%、98.3%和 78.7%。

## 二、资金到位情况

2011 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资 643.7 亿元、地方配套投资 502.1 亿元，到位率分别为 97.1%和 81.2%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程分别拨付到位地方配套投资 118.9 亿元、8.7 亿元、31.3 亿元、343.2 亿元，到位率分别为 109.4%、64.8%、74.7%和 75.6%。




中央财政水利专项资金项目 4847 个。共有 9507 个项目开工建设，其中中央预算内水利投资计划开工 3813 个，中央财政水利专项资金开工 5694 个，开工率分别为 89.1% 和 93.5%。

#### 四、投资完成情况


2011 年中央预算内水利投资计划已累计完成投资 919.7 亿元，其中中央投资 520.7 亿元、地方配套投资 399.0 亿元，完成率分别为 78.5%（见图 3）和 64.6%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 201.3 亿元、大中型病险水库除险加固工程 11.6 亿元、灌区建设与节水改造工程 50.6 亿元、重大水利工程 257.2 亿元，完成率分别为 99.7%、46.5%、81.7% 和 68.7%。

图3 2011年中央预算内投资中央投资完成率  
(按地区分)

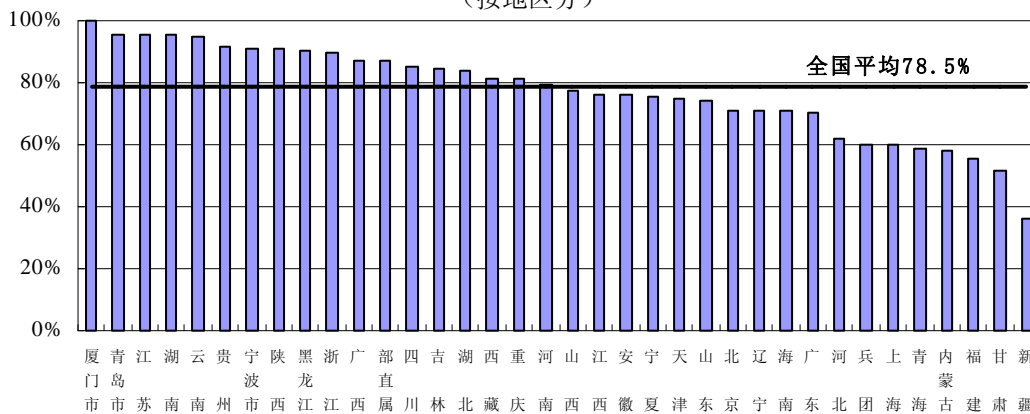

2011 年中央财政水利专项资金已累计完成 514.6 亿元，其中中央资金 329.7 亿元、地方配套资金 184.9 亿元，完成率分别为 76.7%（见图 4）和 81.0%。在完成的中央资金中，中小河流治理 89.6 亿元、小型病险水库除险加固 137.3 亿元、小型农田水利建设 99.9 亿元，完成率分别为 68.9%、82.0% 和 79.8%。

图4 2011年中央财政水利专项投资完成率  
(按地区分)

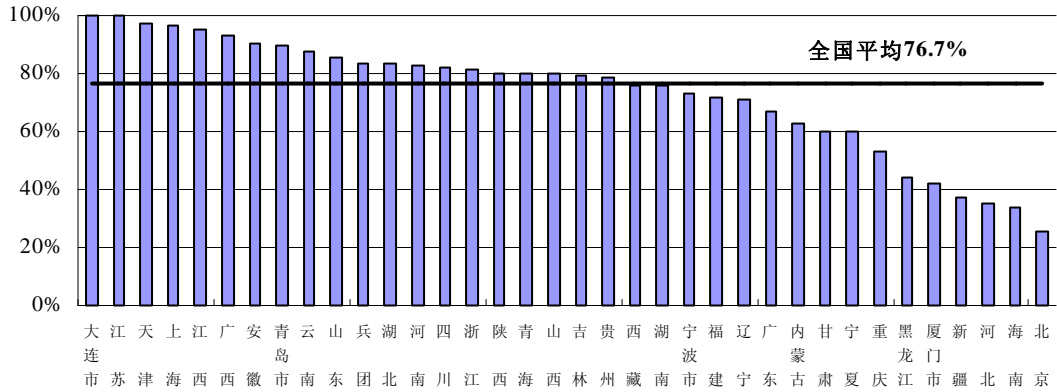

### 五、工程进展情况

2011 年中央水利投资计划已开工项目累计完成土方 118458.5 万立方米, 石方 13765.4 万立方米, 砼 2061.1 万立方米, 金属结构 41.4 万吨。累计新建及加固堤防长度 3930.0 公里, 河道清淤疏浚和岸线整治 3905.6 公里, 累计新增渠道整治和防渗长度 24977.4 公里, 累计治理水土流失面积 767.3 平方公里。

### 六、数据报送情况

本期月报绝大多数省份按期报送了数据, 数据质量较好, 但因河南、重庆、兵团存在数据错误等问题, 引起个别数据调整。

---

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

---

共印 130 份
