

# 中央水利建设投资统计 月报 (四月)

水利部规划计划司

2012年5月10日

---

2011年累计安排中央水利投资计划1140.8亿元，纳入月报统计的中央投资1093.0亿元（不含南水北调19亿元、山洪灾害防治县级非工程措施建设补助专项资金28亿元、由其他部门实施的小型农田水利建设专项资金0.8亿元），其中中央预算内投资663.1亿元，主要安排农村饮水安全工程202亿元、大中型病险水库（闸）除险加固工程25.0亿元、灌区建设与节水改造工程62.0亿元、重大水利工程374.1亿元；中央财政水利专项资金429.9亿元，主要安排中小河流治理130亿元、小型病险水库除险加固168亿元、小型农田水利建设125.2亿元、农村水电增效扩容改造6.7亿元。

截至2012年4月30日统计：

## 一、投资计划下达情况

2011年中央预算内水利投资663.1亿元，要求地方配套投资618.1亿元。已下达到项目单位中央投资计划651.7亿元、地方配套投资计划590.5亿元，投资计划下达率分别为98.3%和


95.5%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程中央投资分别下达 202.0 亿元、24.97 亿元、62.0 亿元、362.8 亿元，投资计划下达率分别为 100%、99.9%、100%和 97.0%。

2011 年中央财政水利专项资金预算共 429.9 亿元，已分解下达项目单位 408.1 亿元，预算分解下达率为 94.9%。其中中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设和农村水电增效扩容改造中央投资分别下达 114.1 亿元、165.8 亿元、123.1 亿元和 5.1 亿元，预算分解下达率分别为 87.8%、98.7%、98.3%和 75.7%。

## 二、资金到位情况


2011 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资 637.6 亿元、地方配套投资 488.9 亿元，到位率分别为 96.2%和 79.1%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程分别拨付到位地方配套投资 118.9 亿元、8.1 亿元、30.8 亿元、331.2 亿元，到位率分别为 109.3%、60.6%、73.5%和 72.9%。

图1 2011年中央预算内投资地方配套投资拨付率  
(按地区分)

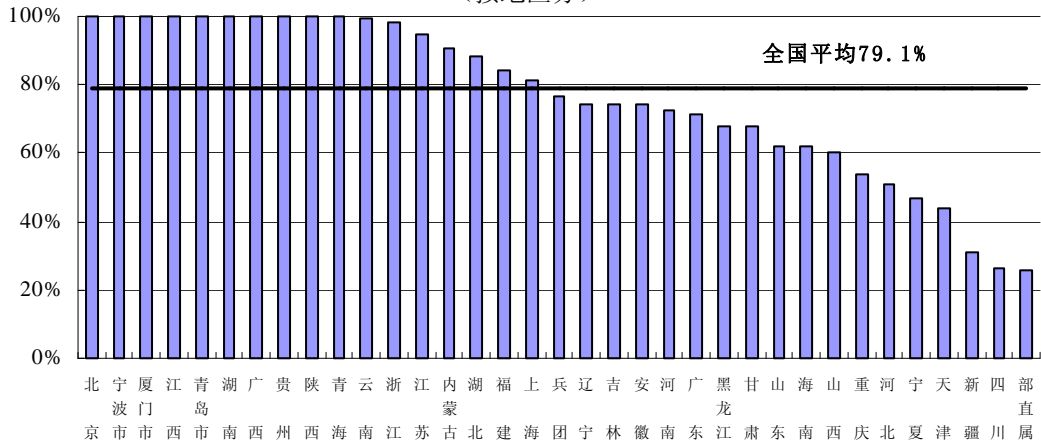

2011 年中央财政水利专项资金已拨付项目单位中央资金 396.7 亿元、地方配套资金 210.3 亿元，到位率分别为 92.3%和 96.1% (见图 2)。

图2 2011年中央财政水利专项投资计划地方配套投资拨付率  
(按地区分)

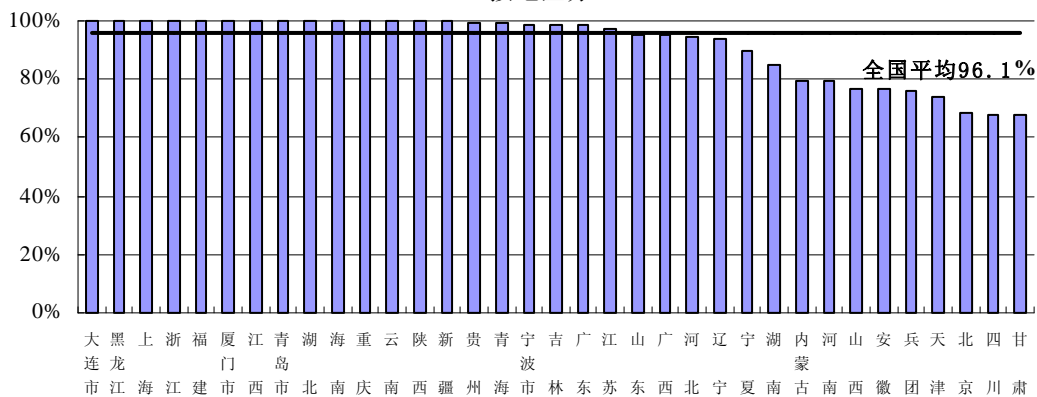

### 三、前期工作和开工情况

2011 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 10208 个，其中中央预算内水利建设投资计划 4247 个，中央财政水利专项资金 5961 个。共有 7912 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作，其中中央预算内水利投资计划项目 3390 个，





---

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

---

共印 130 份
